



**REALISATIE
HOOGWATERBESCHERMINGS-
PROGRAMMA
PROJECT EILAND VAN DORDRECHT**

Zonder begeleiding of toestemming van de combinatie is het verboden om het werkterrein te betreden. Wij merken dat het mooie weer uitlokt tot fietsen en wandelen op en rond het werkterrein. Dit kan, zowel voor u als voor ons, leiden tot onveilige situaties!



Nieuwe bestemming voor het heultje

Het heultje is de gemetselde brug die de Combinatie heeft verplaatst van de Spinel naar het natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven. Het museum Twintighoeven heeft laten weten dat de brug een mooie bestemming heeft gekregen. Ze zijn erg blij met de historische brug in hun tuin.

Stand van zaken

In deelgebieden 1, 7, en 8 wordt volop verder gewerkt aan het realiseren van het definitieve dijklichaam. Op een groot deel van het binnen- en buitentalud wordt de klei verwerkt.

Wegconstructie

Het cunet van de toekomstige binnendijkseweg is ontgraven en op een aantal locaties gevuld met zand voor zandbed.

Gemaal Loudon

Werkzaamheden nabij gemaal Loudon liggen momenteel stil (deel 4). Op dit moment vindt overleg plaats met betrokkenen over het ontwerp en de werkmethode. Wij verwachten dat we in augustus/september starten met de voorbereidingen.

Damwand Wielhovenstraat

De voorbereidingen voor de te plaatsen damwand ter hoogte van de Wielhovenstraat (deelgebied 8) zijn gestart. Wij verwachten dat we in week 27 kunnen beginnen met het aanbrengen van de damwand. De doorlooptijd van deze werkzaamheden is ongeveer 2 à 3 weken. Hierna starten we met het aanbrengen van een deksloof en wordt drainage aangebracht.

*Met deze nieuwsbrief informeert Combinatie Eiland van Dordrecht¹ u over de werkzaamheden in het kader van de realisatie van het Hoogwaterbeschermings-programmaproject **Eiland van Dordrecht**. Specifiek geeft de combinatie aan of, en welke hinder u mogelijk ondervindt van de werkzaamheden die staan gepland in het deelgebied **Wieldrechtse Zeedijk**. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief contactgegevens en veiligheidsvoorschriften.*

Contact

Projectkantoor

U vindt ons kantoor op het terrein van de Makro: Toermalijnring 2000, Dordrecht.

1x2 weken: Inloopmiddag

In de even weken bent u van harte welkom op vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De koffie staat klaar in ons projectkantoor aan de Toermalijnring 2000.

Vragen over de realisatie

Voor vragen over de realisatie kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat Eiland van Dordrecht.

Het projectsecretariaat is 24/7 bereikbaar op: 06 53 29 65 20. U kunt ons ook mailen:

secretariaat@combinatie-evd.nl

COMBINATIE
EILAND VAN DORDRECHT

¹ Combinatie Eiland van Dordrecht is een samenwerkingsverband tussen Van Oord en GMB Civiel.


Van Oord
Marine ingenuity

GMB
Groen en blauw samen



Het project wordt uit gevoerd in opdracht van Waterschap Hollandse Delta.

waterschap
**Hollandse
Delta**

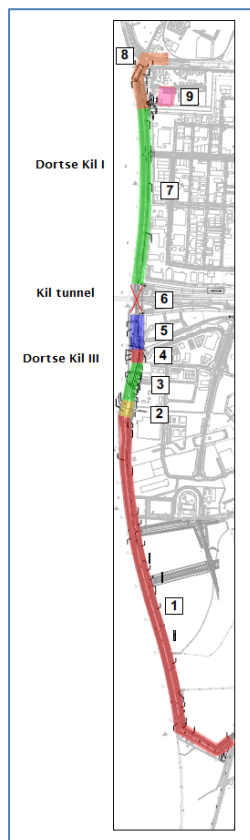

Bestuurders onder de indruk van het werk

Op vrijdag 26 juni bezocht het college van de gemeente Dordrecht de wijk Stadspolders en de dijkversterking Eiland van Dordrecht.

Van heemraad Leo van Gelder en omgevingsmanager Thomas van Meerten (Waterschap Hollandse Delta) kregen ze bij de Bildersteeg en Wantijdijk uitleg over de versterking. Burgemeester Brok en de wethouders waren onder de indruk van het werk en te spreken over de voortgang.



Dit gebeurt de komende maanden

Hieronder is de planning voor de realisatie van werkzaamheden aan dijkvak Wioldrechtse Zeedijk weergegeven.

Juli	Augustus	September
• Werkzaamheden definitieve afwerking binnenberm (aanbrengen drainage/profileren zandlichaam). • Werkzaamheden aanpassen binnendijks talud vanaf zuidzijde. • Ontgraven bestaande dijk ten behoeve van nieuw aan te brengen kleibekleding. • Aanvoeren en lossen benodigde klei via het water/per schip. • Aanbrengen/profileren klei. • Ontgraven cunet en aanbrengen zand ten behoeve van wegen, fietspaden en inspectiepad. • Verwijderen en/of verplaatsen voorbelasting. • Afwerking damwand Wioldrechtse Zeedijk (deksloof, hekwerk en drainage).	• Werkzaamheden definitieve afwerking binnenberm (aanbrengen drainage/profileren zandlichaam). • Werkzaamheden aanpassen binnendijks talud vanaf zuidzijde. • Ontgraven cunet en aanbrengen zand ten behoeve van wegen, fietspaden en inspectiepad. • Aanvoeren en lossen benodigde klei via het water/per schip. • Aanbrengen/profileren klei. • Voorbereiden en afvoeren materiaal uit depots. • Voorbereiden sanering gemaal Loudon. • Aanbrengen funderingen wegen, fietspaden en inspectiepad. • Waterpartij Wielhoven.	• Werkzaamheden definitieve afwerking binnenberm (aanbrengen drainage/profileren zandlichaam). • Werkzaamheden aanpassen binnendijks talud vanaf zuidzijde. • Ontgraven cunet en aanbrengen zand ten behoeve van wegen, fietspaden en inspectiepad. • Aanvoeren en lossen benodigde klei via het water/per schip. • Aanbrengen/profileren klei. • Uitvoeren werkzaamheden gemaal Loudon. • Aanbrengen fundering wegen, fietspaden en inspectiepad.

**Het is verboden om het werkterrein te betreden
voor uw én onze veiligheid!**

Wij attenderen u erop dat u te allen tijde rekening dient te houden met uw en andermans veiligheid. Op en rond het werkterrein gelden onder andere de volgende veiligheidsregels:

- Zonder begeleiding of toestemming van de combinatie is het verboden het werkterrein te betreden.
- Kom niet op de werkwegen en blijf op afstand van het materieel.

Calamiteiten kunt u 24/7 melden op het nummer: 06 53 29 65 20

Redactie: Combinatie Eiland van Dordrecht, Versie 1.0
